

# Cronoprogramma dei lavori

All. XV del D. Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09

**Ente appaltante** Comune di Ramacca – IV Area Gestione del Territorio, Via M. Polo n. 1 – 95040 Ramacca (CT)

**Lavori di** Realizzazione prolungamento di Via Padre Pio  
CUP: F14E12000270004

**Comune di** Ramacca

**Provincia di** Catania

**R.U.P. – Responsabile dei lavori** Geom. Sottosanti Salvatore, Via M. Polo n. 1  
95040 Ramacca (CT)

**Direttore dei Lavori** dott. ing. Lizio Vincenzo con studio in Ramacca  
(CT) via G. Santagati n. 114

**Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)**

**Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)** dott. ing. Lizio Vincenzo con studio in Ramacca  
(CT) via G. Santagati n. 114



Ramacca \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Prima emissione	////	del	

**Per presa visione:**

CSE

(data, timbro e firma) \_\_\_\_\_

Il R.U.P e Resp. dei Lavori

(data, e firma) \_\_\_\_\_

L'impresa esecutrice

(data, timbro e firma) \_\_\_\_\_

## ELENCO FASI DI LAVORAZIONE

Di seguito si riporta la cronologia delle fasi di lavorazione:

- 1. Incantieramento.**
- 2. Realizzazione strada quale prolungamento di Via Padre Pio.**
- 3. Smontaggio cantiere e pulizia finale**

Di seguito tali lavorazioni vengono dettagliate e cronologicamente definite.

Attività	Durata	Data inizio	Data Fine
<b>1. Incantieramento</b>	<b>1 g</b>	<b>lun 29/04/19</b>	<b>lun 29/04/19</b>
1.1 Realizzazione recinzione di cantiere e posa cartellonistica	1 g	lun 29/04/19	lun 29/04/19
1.2 Installazione baracche di cantiere (Spogliatoio e WC)	1 g	lun 29/04/19	lun 29/04/19
<b>2. Realizzazione strada quale prolungamento di via P. Pio</b>	<b>28 g</b>	<b>mar 30/04/19</b>	<b>gio 06/06/19</b>
2.1 Estirpazione di vegetazione esistente	1 g	mar 30/04/19	mar 30/04/19
2.2 Rimozione di recinzioni esistenti	1 g	mer 01/05/19	mer 01/05/19
2.3 Picchettatura e tracciamenti	1 g	gio 02/05/19	gio 02/05/19
2.4 Sistemazione / scarificazione sede stradale esistente	2 g	ven 03/05/19	lun 06/05/19
2.5 Trasporto del materiale di scarificazione a rifiuto	2 g	ven 03/05/19	lun 06/05/19
2.6 Compattazione del fondo sede stradale	1 g	mar 07/05/19	mar 07/05/19
2.7 Realizzazione fondazione sede stradale con misto granulometrico	2 g	mer 08/05/19	gio 09/05/19
2.8 Posa carpenteria fondazione orlatura	1 g	ven 10/05/19	ven 10/05/19
2.9 Getto di cls fondazione orlatura	1 g	lun 13/05/19	lun 13/05/19


2.10 Disarmo carpenteria fondazione orlatura	1 g	mar 14/05/19	mar 14/05/19
2.11 Posa in opera di orlatura	3 g	mer 15/05/19	ven 17/05/19
2.12 Realizzazione fondazione sede marciapiede con misto granulometrico	1 g	lun 20/05/19	lun 20/05/19
2.13 Posa in opera rete elettrosaldata massetto marciapiede	1 g	mar 21/05/19	mar 21/05/19
2.14 Getto cls massetto marciapiede	1 g	mer 22/05/19	mer 22/05/19
2.15 Posa armatura cordoletto marciapiede	1 g	gio 23/05/19	gio 23/05/19
2.16 Realizzazione carpenteria cordoletto marciapiede	1 g	ven 24/05/19	ven 24/05/19
2.17 Getto cls cordoletto marciapiede	1 g	lun 27/05/19	lun 27/05/19
2.18 Disarmo carpenteria cordoletto cls	1 g	mar 28/05/19	mar 28/05/19
2.19 Posa in opera pavimentazione marciapiede	4 g	mer 29/05/19	lun 03/06/19
2.20 Posa in opera di misto bituminoso di base sede stradale	1 g	mar 04/06/19	mar 04/06/19
2.21 Posa in opera di conglomerato bituminoso- binder sede stradale	1 g	mer 05/06/19	mer 05/06/19
2.22 Posa in opera di conglomerato bituminoso-usura sede stradale	1 g	gio 06/06/19	gio 06/06/19
<b>3. Smontaggio cantiere e pulizia finale</b>	<b>1 g</b>	<b>ven 07/06/19</b>	<b>ven 07/06/19</b>
3.1 Smontaggio baraccamenti di cantiere	1 g	ven 07/06/19	ven 07/06/19
3.2 Smontaggio recinzioni, cartellonistica e pulizia finale	1 g	ven 07/06/19	ven 07/06/19

Data presunta inizio lavori 29/04/2019

Data presunta fine lavori 07/06/2019

Giorni effettivi di lavorazione 30

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

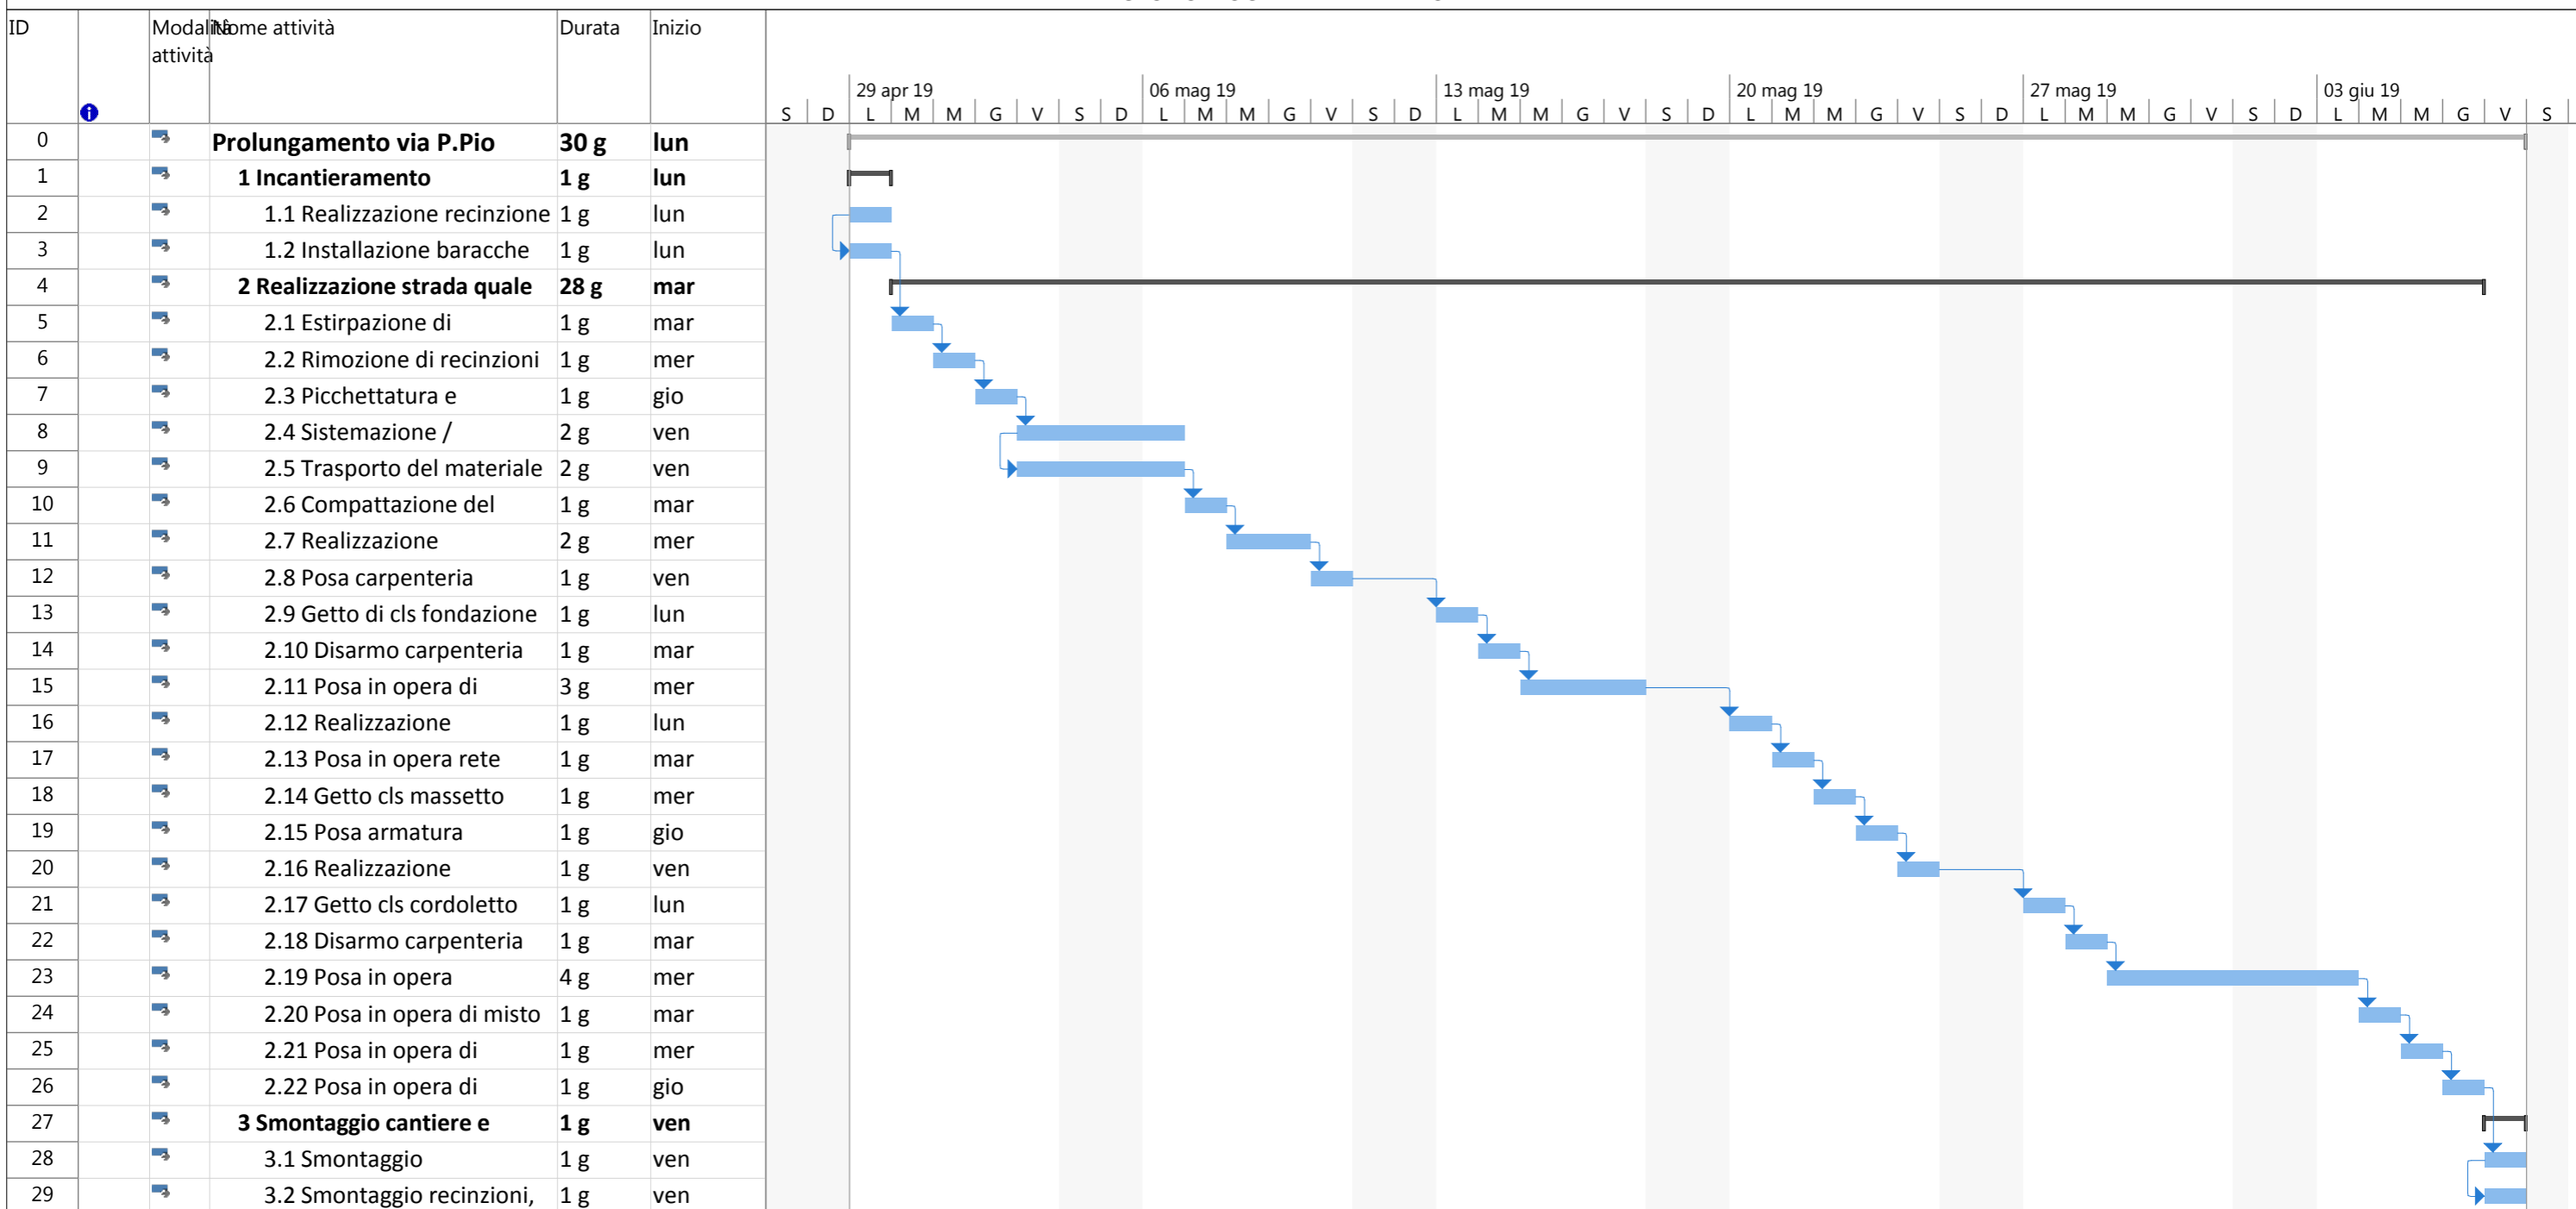

Oggetto: Progetto per la "Realizzazione prolungamento via P. Pio" CUP F14E12000270

Attività		Riepilogo progetto		Attività manuale		Solo inizio		Scadenza	
Divisione		Attività inattiva		Solo-durata		Solo-fine		Avanzamento	
Cardine		Cardine inattiva		Riporto riepilogo manuale		Attività esterne		Avanzamento manuale	
Riepilogo		Riepilogo inattiva		Riepilogo manuale		Cardine esterno			
